České Meziříčí - kanalizace a ČOV - 1. etapa

první pracovní varianta

Nasazení 4 x strojník,18x dělník

2x THP
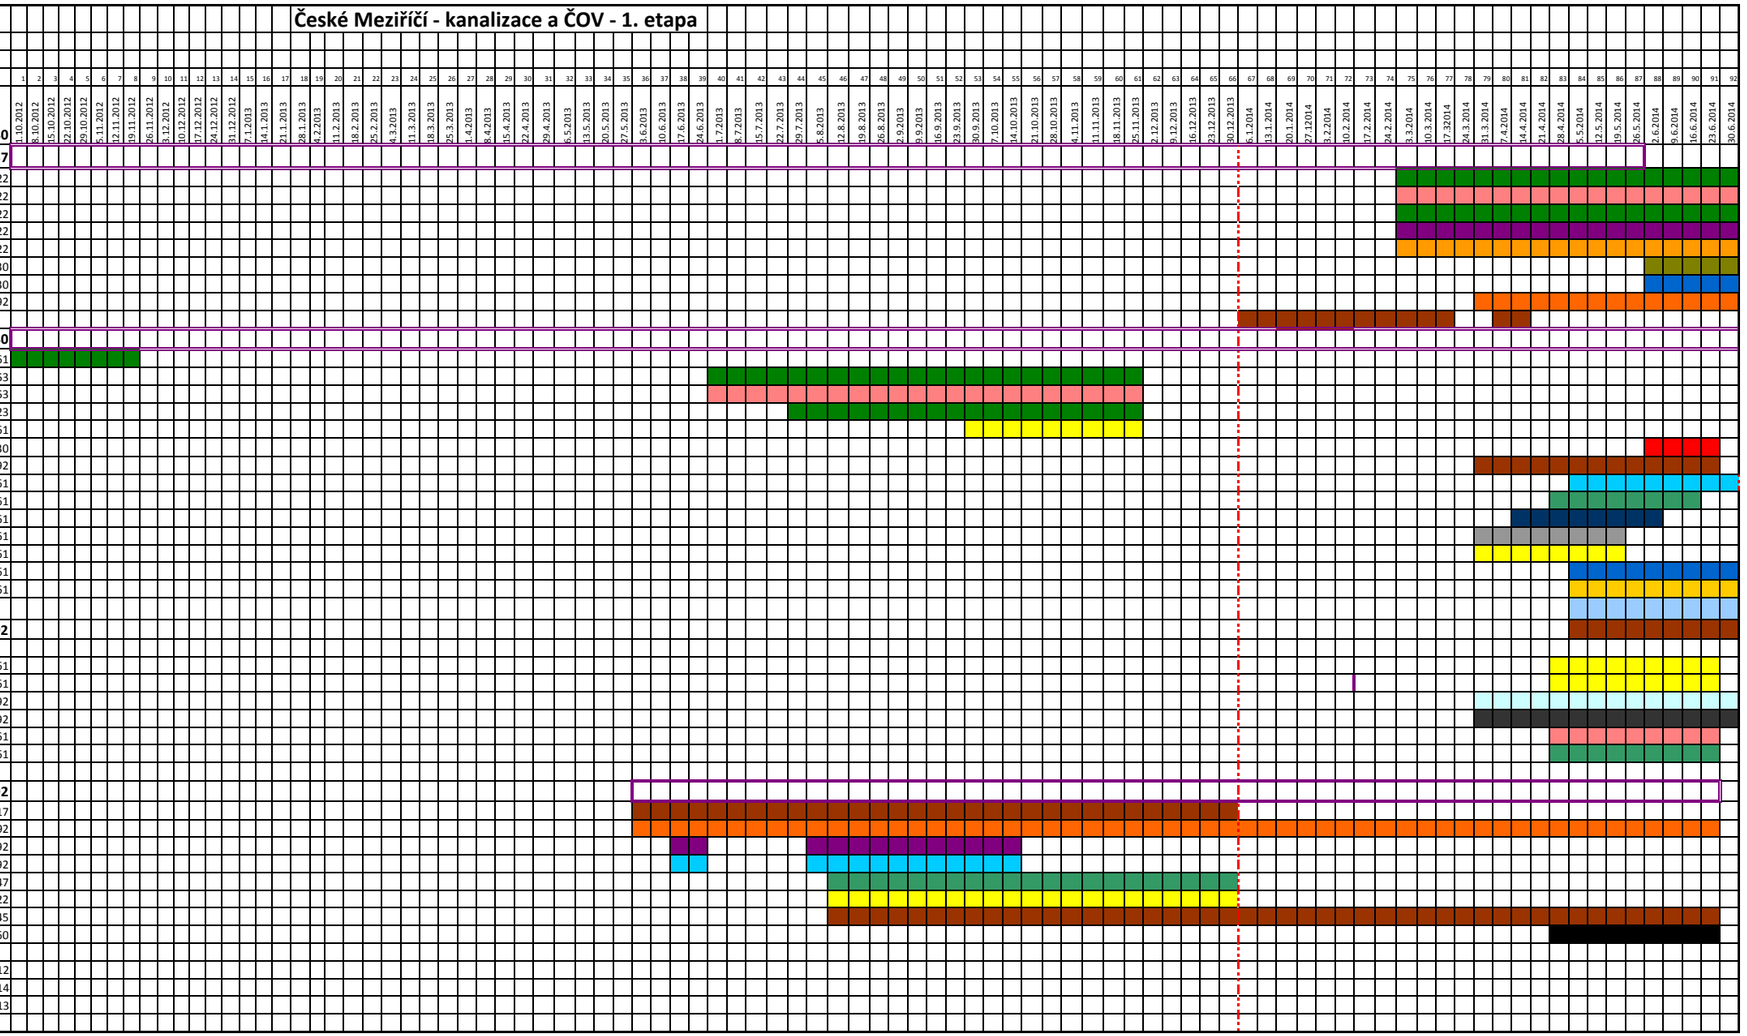
týden 1.10.2012		
Termín výstavby		**640**
ČOV		**457**
Provozní soubory	3.3.2014-25.6.2014	122
Čerpací stanice	3.3.2014-25.6.2014	122
Sdružení objekt	3.3.2014-25.6.2014	122
Biologický stupeň znečištění	3.3.2014-25.6.2014	122
Strojní odvodnění kalu	3.3.2014-25.6.2014	122
Měření regulace	9.6.2014-25.6.2014	30
Automatizovaný systém řízení	9.6.2014-25.6.2014	30
Provozní rozvod silnoproudu		92
	31.3.2014-25.6.2014	
Stavební objekty		**640**
Příprava území	1.10.2012-25.11.2012	61
Čerpací stanice	1.7.2013-30.11.2013	153
Sdružení objekt	1.7.2013-30.11.2013	153
Biologický stupeň znečištění	29.7.2013-30.11.2013	123
Měrný objekt na odtoku	7.10.2013-30.11.2013	61
Spojovací potrubí	2.6.2014-23.6.2014	30
Spojovací potrubí	31.3.2014-23.6.2014	92
Terenní a sadové úpravy	5.5.2014-25.6.2014	61
Oplocení	28.4.2014-22.6.2014	61
Vozovky a zpevněné plochy	14.4.2014-8.6.2014	61
Vozovky a zpevněné plochy	31.3.2014-25.5.2014	61
Venkovní osvětlení	31.3.2014-25.5.2014	61
Vodovní přípojka	5.5.2014-25.6.2014	61
Přípojka NN	5.5.2014-25.6.2014	61
Kanalizace		**92**
Provozní soubory		
Čerpací stanice stoka A strojně technologická část	28.4.2014-23.6.2014	61
Čerpací stanice stoka B strojně technologická část	28.4.2014-23.6.2014	61
Čerpací stanice stoka A přípojka NN	31.3.2014-25.6.2014	92
Čerpací stanice stoka B přípojka NN	31.3.2014-25.6.2014	92
Čerpací stanice stoka A MaR,ASŘTP	28.4.2014-25.6.2014	61
Čerpací stanice stoka B MaR,ASŘTP	28.4.2014-25.6.2014	61
Stavební objekty		**392**
Kanalizace Stoka A	3.6.2013-31.12.2013	217
Kanalizace Stoka B	6.6.2013-23.6.2014	392
Čerpací stanice stoka A	17.6.2013-20.10.2013	92
Čerpací stanice stoka B	17.6.2013-20.10.2013	92
Odbočky pro domovní přípojky A	12.8.2013-31.12.2013	147
Odbočky pro domovní přípojky B	12.8.2013-23.6.2014	322
Přeložky inženýrský sítí	12.8.2013-23.6.2014	245
Odstranění stavající kanalizace	28.4.2014-23.6.2014	60
Milník 1 zahajení výstavby ČOV		1.10.2012
Milník 2 Dokončení prací na kanalizaci		29.6.2014
Milník 3 Dokončení prací na ČOV		31.12.2013
Ostatní náklady
